


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,769.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.	
61566/0001/4743	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TRAMO CAPULIN A XITOXI, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD RANCHERIA PALOMAS. / RANCHERIA LAS PALOMAS (LOS TACHOS)	CONTRATO	2023-03-29	2023-06-09	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	1,699,015.30	1,699,015.30	0.00	01 METRO LINEAL	3	POBLADO	1	457	49	49.97	
61566/0002/8406	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO TRAMO RINCÓN BONITO A LAS CABAÑAS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRATO	2023-09-18	2023-12-11	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3	POBLADO	1	105	0	0.00	
61567/0003/10955	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN NORTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRATO	2023-08-14	2023-10-07	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3	POBLADO	1	78	0	0.00	
61571/0004/8398	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN SUR, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRATO	2023-10-16	2023-11-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3	POBLADO	1	58	0	0.00	
61575/0005/8257	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DEL SOL Y CALLE MARTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES	CONTRATO	2023-11-01	2023-12-15	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3	POBLADO	1	175	0	0.00	
61585/0006/10589	05 EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES	CONTRATO	2023-07-15	2023-09-15	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	289	287	0	0.00	
61595/0007/10859	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA / TLAZALA DE FABELA	CONTRATO	2023-06-19	2023-08-31	1,465,028.36	1,465,028.36	0.00	732,300.32	732,300.32	0.00	02 METRO CUADRO	3	POBLADO	1	138	49	49.99	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 7											TOTAL		0.00		2,431,315.62		2,431,315.62		0.00		98	

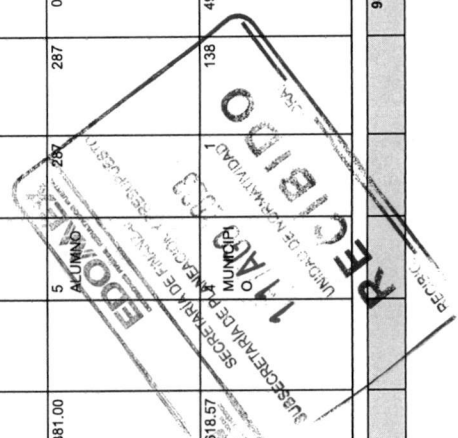

Complementarios: 5

Directa: 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,769.00

REINTEGRACION DE LA OBRERA Y/O ACCION

MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2023. JUNIO




Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
							Fec ini Real	Fec Ter Real	Fec ini Real	Fec Ter Real			R. del Fondo	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	

[Signature]
LICENCIADA EN
PEDAGOGÍA ASTRID
ANITA DÁVILA ORDÓÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

[Signature]
L.C. GUSTAVO SANCHEZ
DURÁN
TESORERO Y
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

[Signature]
ING. TOMÁS MONDRAGÓN
TORRES
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y D. URBANO

[Signature]
MTR. ALAN
CHRISTOPHER
MONCALIAN MORALES
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

